


Travaux CPER



Relogement

Paris, le 13 Novembre 2012.

Calendrier

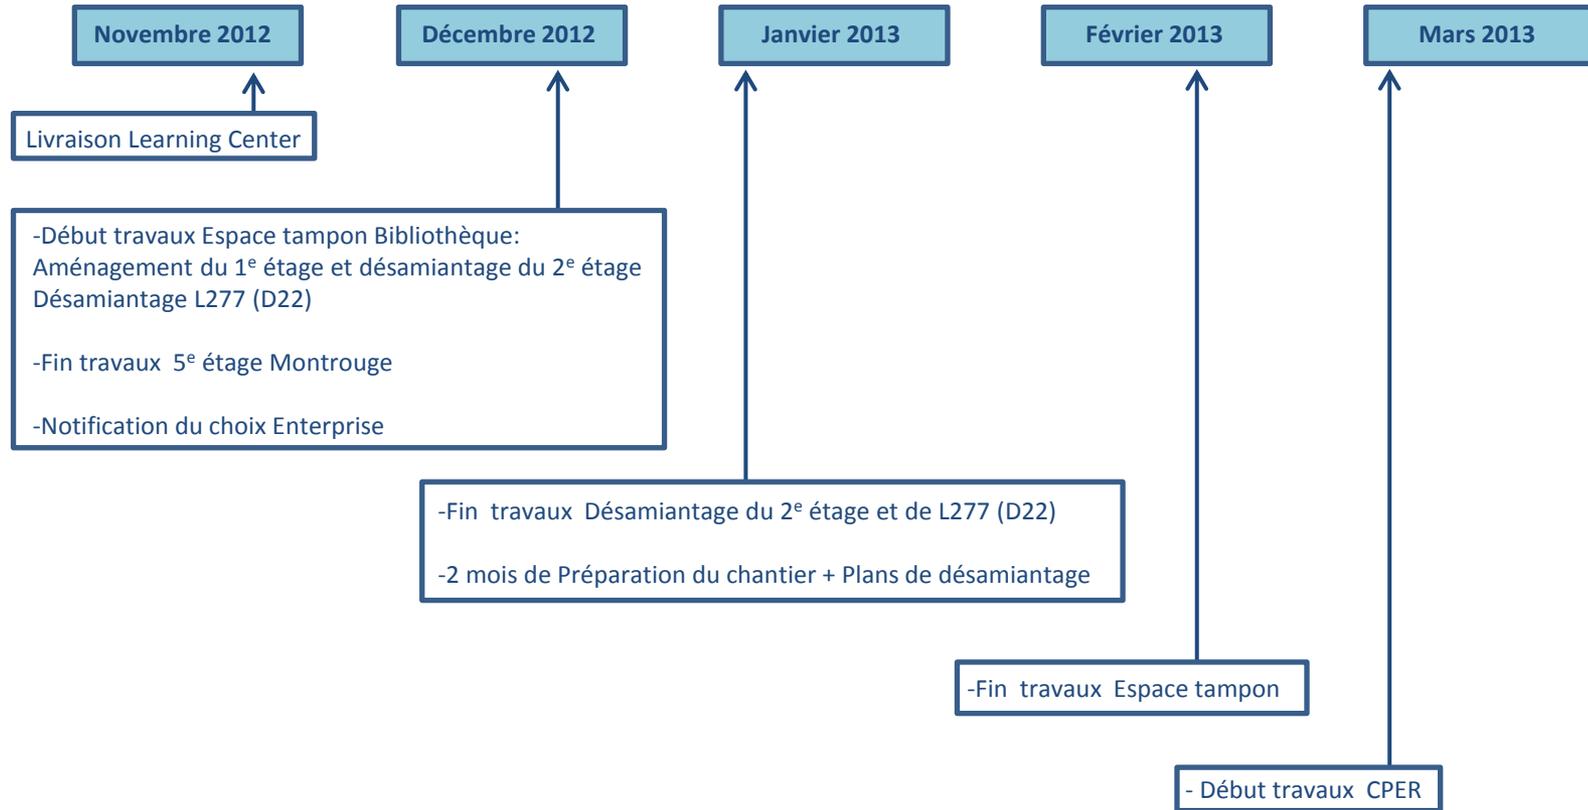

En attendant la réponse de DGS et le Rectorat sur les espaces de de relogement, on travaillera avec les documents suivants :

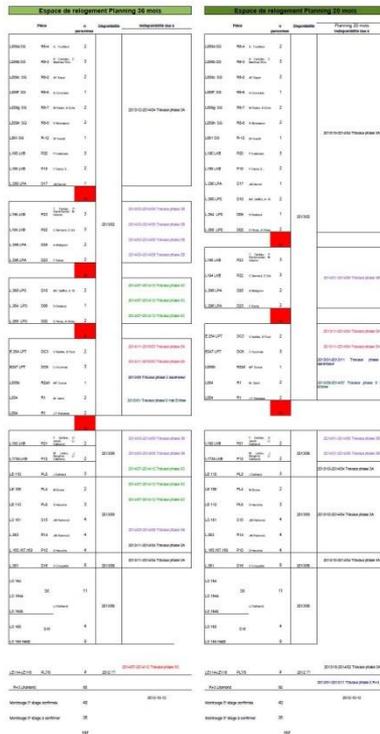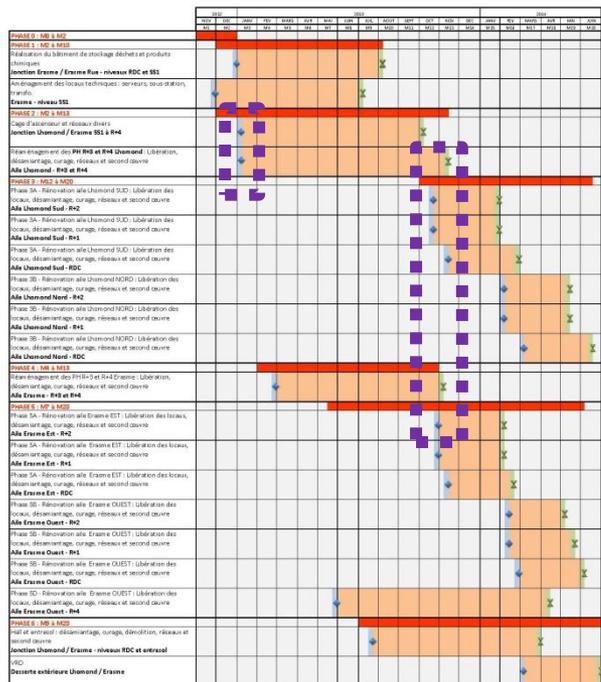

Personnes à reloger (ou loger) Planning 36M						
Pièce	n personnes	Date	Durée			
L378 LPT	T16	5	2013/04		Travaux phase 2 (R-3)	
L555a	H Lallier, A Casoli, B Desforge, M De Luca	RC24	4			
L555b MF Duxois	RC23	1				
L555c F Levrier	RC25	1		Default		
L555e - Viduaux LRA	RC26 e	-	2013/09		Travaux phase 2 : accès	
L556 161 Nachter	P-B	-				
E255 Viduaux LPT	DC4	2				
E256 Viduaux LPT	DC3b	2				
15						
LaTeX	2	2013/09	12 mois			
Phase 3A	60	2013/12	3 mois		Travaux phase 3 Lhomond	
Phase 3B	35	2014/03	3 mois		Travaux phase 3 Lhomond	
Phase 3C	42	2014/03	3 mois		Travaux phase 3 Lhomond	
LaTeX	2	2014/09	12 mois			
Phase 5A	40	2014/11	3 mois		Travaux phase 5 Erasme	
L554a e	R1	3	2015/01	12 mois	Travaux phase 6 Hall Entrée	
LaTeX	2	2015/09	12 mois			
186						

Personnes à reloger (ou loger) Planning 20M						
Pièce	n personnes	Date	Durée			
L378 LPT	T16	5				
L555a	H Lallier, A Casoli, B Desforge, M De Luca	RC24	4			
L555b MF Duxois	RC23	1				
L555c F Levrier	RC25	1	2013/01	Default	Travaux phase 2 : accès	2
L555e - Viduaux LRA	RC26 e	-				
L556 161 Nachter	P-B	-				
E255 Viduaux LPT	DC4	2				
E256 Viduaux LPT	DC3b	2				
15						
LaTeX	2	2013/09	12 mois			
L554a e	R1	3	2013/09	10 mois	Travaux phase 6 Hall Entrée	
Phase 5A SA	142	2013/12	3 mois		Travaux phase 3 Lhomond Erasme	3-5
Phase 3B	35	2014/02	3 mois		Travaux phase 3 Lhomond	
LaTeX	2	2014/09	12 mois			
LaTeX	2	2015/09	12 mois			
186						


pour:

- Trouver le maximum de solutions de relogement en interne (solidarité intra-laboratoires)
- Actualiser les départs et arrivées, notamment ceux qui sont proches au début des travaux CPER
- Adapter les besoins des équipes aux espaces tampons (3^e étage Lhomond) et les locaux libérés par les Secrétariats et la Direction)

Capacité de relogement de Montrouge:
40 personnes + 35 personnes (en négociation)

Fin de travaux Espace tampon Bibliothèque
Capacité de relogement des locaux libérés: 60 personnes (50 en Phases 3A -5A et 10 en Phase 3B)

Capacité de relogement des locaux libérés:
LS161/S15, LS164/S6 et LS165/S18: 30 personnes + 13 personnes dans bureaux

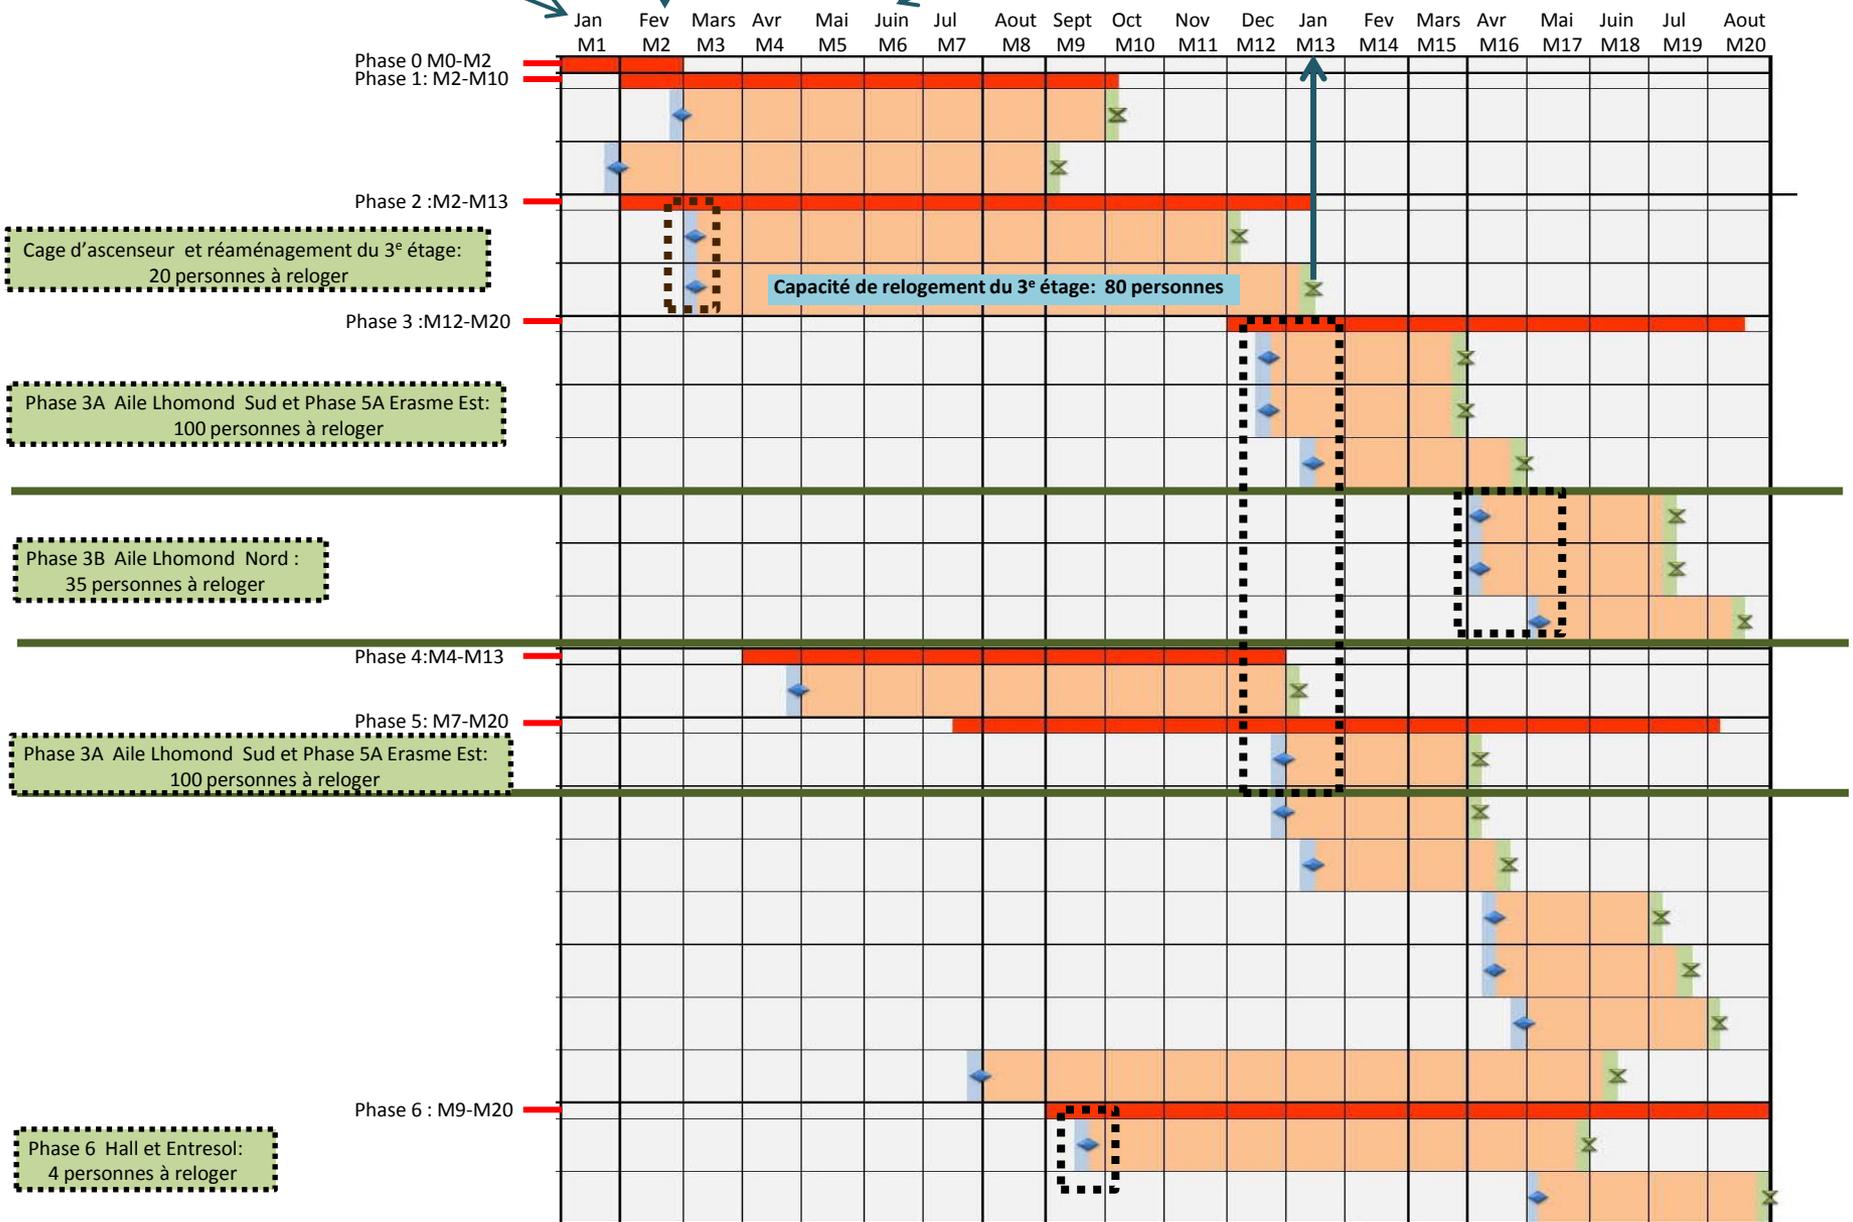

PHASAGE DES TRAVAUX EN 20 MOIS - PHASE F

PHASAGE
ouVrages Publics



M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Niveaux R+3 et R+4 [1]

- Lots techniques
- Finitions

Lhomond Sud [2]

- Désamiantage

Erasmus Est [3]


- Désamiantage/courage

Niveaux R+4 et R+5 [4]

- Couverture
- Travaux réseaux (ouverture de trémies)

Hall, entresol [5]

- Gros œuvre

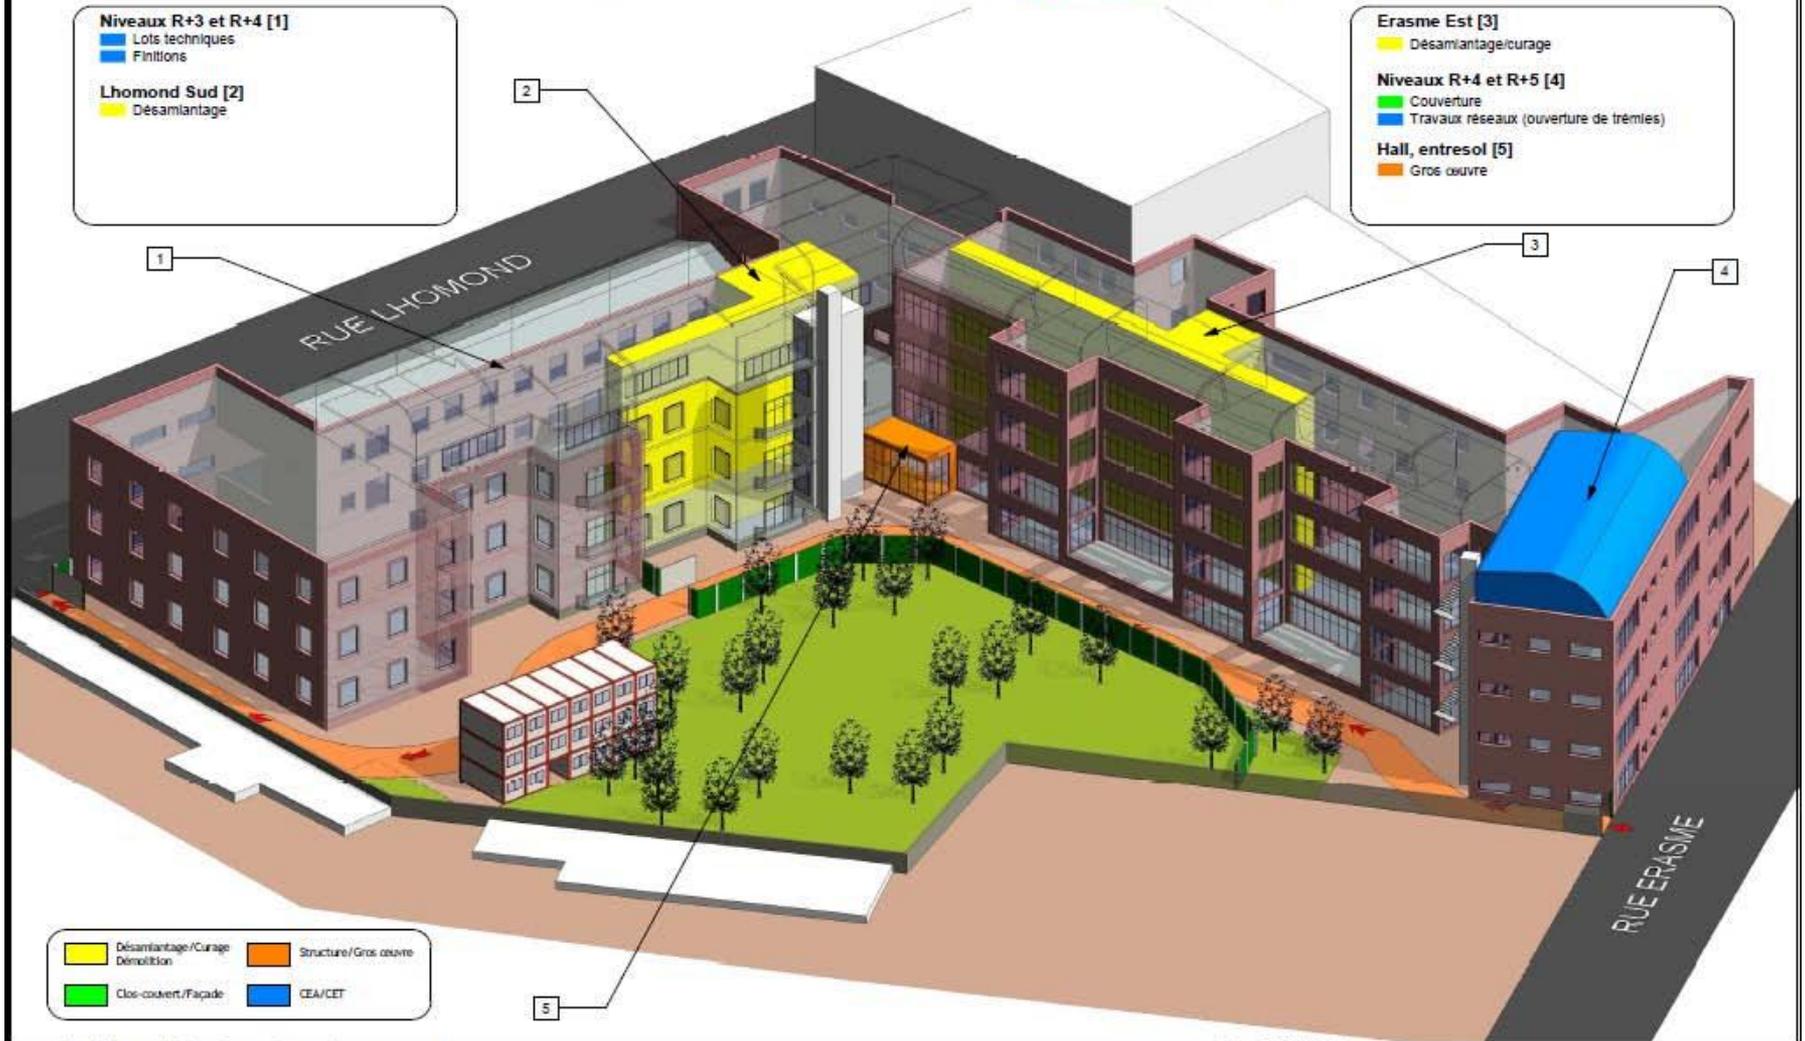

- Désamiantage/Courage Démolition
- Structure/Gros œuvre
- Clos-couvert/Façade
- CEA/CET
