

Département de Physique



Département
de Physique
École normale
supérieure



Paris, le 01 avril 2015

Calendrier prévisionnel de mise à disposition

Phase	Découpage des phases	Achèvement des travaux BOUYGUES	Fin Etat des lieux après travaux	mise à disposition ENS
Phase 3A	Niveau R+2 Lhomond aile centrale	03/04/2015	07/04/2015 au 10/04/2015	13/04/2015
Phase 3A	Niveau R+1 Lhomond aile centrale	10/04/2015	13/04/2015 au 17/04/2015	20/04/2015
Phase 3A	Niveau Rdc Lhomond aile centrale	17/04/2015	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015
Phase 3A	Niveau SS1 Lhomond aile centrale	24/04/2015	27/04/2015 au 30/04/2015	04/05/2015
Phase 5A	Niveau R+3 Erasme aile centrale	03/04/2015	07/04/2015 au 10/04/2015	13/04/2015
Phase 5A	Niveau R+2 Erasme aile centrale	10/04/2015	13/04/2015 au 17/04/2015	20/04/2015
Phase 5A	Niveau R+1 Erasme aile centrale	17/04/2015	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015
Phase 5A	Niveau RDC Erasme aile centrale	30/04/2015	04/05/2015 au 07/05/2015	11/05/2015
Phase 5A	Niveau SS1 Erasme aile centrale	30/04/2015	04/05/2015 au 07/05/2015	11/05/2015
Phase	Découpage des phases	Déménagement ENS	Etat des lieux (locaux vides)	Prise de possession de la zone par BOUYGUES
Phase 3B	Niveau R+2 Lhomond aile coté terrain tennis	13/04/2015 au 17/04/2015	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015
Phase 3B	Niveau R+1 Lhomond aile coté terrain tennis	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015 au 30/04/2015	04/05/2015
Phase 3B	Niveau Rdc Lhomond aile coté terrain tennis	27/04/2015 au 30/04/2015	04/05/2015 au 07/05/2015	11/05/2015
Phase 3B	Niveau SS1 Lhomond aile coté terrain tennis	04/05/2015 au 07/05/2015	11/05/2015 au 13/05/2015	18/05/2015
Phase 5B	Niveau R+3 Erasme aile coté rue	13/04/2015 au 17/04/2015	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015
Phase 5B	Niveau R+2 Erasme aile coté rue	20/04/2015 au 24/04/2015	27/04/2015 au 30/04/2015	04/05/2015
Phase 5B	Niveau R+1 Erasme aile coté rue	27/04/2015 au 30/04/2015	04/05/2015 au 07/05/2015	11/05/2015
Phase 5B	Niveau RDC Erasme aile coté rue	11/05/2015 au 15/05/2015	18/05/2015 au 22/05/2015	26/05/2015
Phase 5B	Niveau SS1 Erasme aile coté rue	11/05/2015 au 15/05/2015	18/05/2015 au 22/05/2015	26/05/2015

Cette période pourrait correspondre aux consignations par le services techniques (selon l'organisation qui a eu lieu pour la phase 3A)

Avril				Mai			
		Retour aux locaux immobilisés pendant les phases 3A et 5A (Ailes Centrales)	Départ des locaux qui seront immobilisés pendant les phases 3B et 5B (Ailes coté terrain tennis et rue)			Retour aux locaux immobilisés pendant les phases 3A et 5A (Ailes Centrales)	Départ des locaux qui seront immobilisés pendant les phases 3B et 5B (Ailes coté terrain tennis et rue)
1	M			1	V		
2	J			2	S		
3	V			3	D		
4	S			4	L		
5	D			5	M	État lieux RDC et SS1/SS2 Érasme le 05/05/15 – 14H30 Déménagement SS1 Lhomond	État lieux RDC Lhomond État lieux R+1 Érasme Déménagement SS1/SS2 Lhomond
6	L			6	M		
7	M			7	J		
8	M	État lieux R+2 Lhomond État lieux R+3 Érasme le 07/04/15 AM – 14H30		8	V		
9	J			9	S		
10	V			10	D		
11	S			11	L		
12	D			12	M	Déménagement RDC et SS1/SS2 Érasme	État lieux SS1/SS2 Lhomond Déménagement RDC et SS1 Érasme
13	L	État lieux R+1 Lhomond État lieux R+2 Érasme le 14/04/15 AM – 14H30		13	M		
14	M			14	J		
15	M			15	V		
16	J	Déménagement R+2 Lhomond Déménagement R+3 Érasme	Déménagement R+2 Lhomond Déménagement R+3 Érasme	16	S		
17	V			17	D		
18	S			18	L		
19	D			19	M		
20	L	État lieux RDC Lhomond État lieux R+1 Érasme le 21/04/15 AM – 14H30		20	M		État lieux RDC et SS1 Érasme
21	M			21	J		
22	M			22	V		
23	J	Déménagement R+1 Lhomond Déménagement R+2 Érasme	Déménagement R+1 Lhomond Déménagement R+2 Érasme	23	S		
24	V			24	D		
25	S			25	L		
26	D			26	M		
27	L	État lieux SS1 Lhomond le 28/04/15 AM – 14H30		27	M		
28	M			28	J		
29	M	Déménagement RDC Lhomond Déménagement R+1 Érasme	Déménagement RDC Lhomond Déménagement R+1 Érasme	29	V		
30	J			30	S		
1	V			31	D		http://icalendrier.fr/

Déménagement

Planning du déménagement :

Semaine 1: du **13 au 17/04/2015**: **2^e étage Lhomond**

Semaine 2: du 20 au 24/04/2015: 1^e étage Lhomond et 2^e étage Érasme

Semaine 3: du **27 au 30/04/2015**: RDC Lhomond

Semaine 4: du 04 au 07/05/2015: Sous-sol 1 et 2 Lhomond

Le dpt. de Physique demandera à l'entreprise de déménagement de **commencer en début de semaine** par les locaux qui ont été immobilisés pendant la **phase 3A** (exemple : 2^e étage du 13 au 15 avril 2015), **et en suite** d'intervenir dans les locaux qui seront immobilisés pendant la **phase 3B** (exemple : 2^e étage du 15 au 17 avril 2015).

- L'équipe de Davitt déménagera le matériel scientifique au 2^e étage dans le semaine 1. Puis, il déménagera au SS1 dans le semaine 4. L'organisation pour la livraison de la table optique est en cours.
- Les équipes de Fauve et Adda-Bedia déménageront au 3^e étage dans le semaine 1.
- L'équipe de Fauve déménagera au SS1 dans le semaine 4. Ensuite, l'équipe d'Hetet pourrait déménager dans la salle L357-L359.
- Les équipes de Pincet et Bocquet déménageront au 3^e étage dans le semaine 4.
- L'équipe de Croquette déménage en interne. Les noms des membres de l'équipe doivent être transmis à M. Ghirardelli afin de les introduire dans le logiciel qui pilote l'accès à la salle (mail du 06 mars 2015).

Salles L361 et L363-365

		Départ			Arrivée	Disponibilité salles
Wiese, Kay	(L268)	13-15/04/2015	Plaçais Bernard	L294	15-17/04/2015	OK
Toulouse, Gérard	(L270)		Chassagneux Yannick	L294		OK
Amariti, Antonio	(L262)		Hétet Gabriel	L294		OK
Dubreui, Alexis	(L260)		Badi Assaf	L173a	22-24/04/2015	OK
Gurdogan, Omer	(L254)		Inhofer Andreas	L173a		OK
Jin, Yuliang	(L260)		Marguerite Arthur	L175		OK
Bachas, Constantin	(E239a)	20-22/04/2015	Willmart Quentin	L175	29-30/04/2015	OK
Basso, Benjamin	(E237)		Boukhicha Mohammed	L175		OK
Bernard, Denis	(E251)		Wei Yang	L175		OK
Bilal, Adel	(E239c)		Heslot François	L179		OK
Fayet, Pierre	(E245)		Cote Denis	L179		OK
Jacobsen, Jesper	(E240)		Roussignol Philippe	L065		OK
Jaekel, Marc-Thierry	(E252)		Delalande Claude	L065	OK	
Julia, Bernard	(L182)		Flyzanis Christos	L065	OK	
Kashani-Poor, Amir	(E237)		Lafont Omblin	L065	OK	
Kazakov, Vladimir	(E239b)		Jeanet Adrien	L065	OK	
Kounnas, Costas	(E247)		Berthou Simon	L065	OK	
Ledoussal, Pierre	(E249)		Langlois Benjamin	L065	OK	
Policastro, Giuseppe	(E231)		Bastard Gérald	L067	OK	
Troost, Jan	(E231)		Carosella Francesca	L067	OK	
Bouchiat, Claude	(E250)		Ferreira Robson	L067	OK	
Cremmer, Eugène	(E250)		Guldner Yves	L082	OK	
Sourlas, Nicolas	(E252)	Tignon Jérôme	L082	OK		
Negro, Stefano		Maussang Kenneth	L082	OK		
Passerini, Filippo		Dhillon Sukhdeep	L069	OK		
Orlando, Domenico	(L059f)	27-29/04/2015	Mangeney Juliette	L069	OK	
Sadhu, Tridib			De Vaulchier Louis-Anne	L069	OK	
Villamaina, Dario	(L059f)		Lebreton Armand	L069	OK	
Azeyanagi, Tatsuo	(L059b)					

Salle L367

		Départ			Arrivée à L367	Disponibilité salle	
Krzakala	L284	13-15/04/2015	Levrier François	L196	22-24/04/2015	OK	
Brunet	E238	20-22/04/2015	Falgarone Edith			OK	
Derrida	E227a		Jeremy Neveu			OK	
Leyronas	E238		Julien Devriendt			OK	
Hakim	E227b		Visiteur Levrier			OK	
Corson	E234		Pierre Lesaffre			L194	OK
Eric Tramel	L284		13-15/04/2015			Manuel Berthet	
Francesco	L284	13-15/04/2015	Tram Le Ngoc			OK	
Caltagirone							
Weibuch	E242	20-22/04/2015	Visiteur Lesaffre			OK	
d'Humieres	E242		Jan Orkisz	GH215		OK	
Vannimienius	E242		Michel Pérault			OK	
			Emmanuel Dormy	GH310		OK	

Salle L374-376 (Option A équipe Thiam)

		Départ			Arrivée	Disponibilité salle
Diederichs Carole	L288	13-15/04/2015	Équipe Gigan	L192	22-24/04/2015 et jusqu'au	OK
Voisin Christophe	L288					OK
Baudin Emmanuel	L288					OK
Morfin Pascal						OK
Pascal Anaelle						OK
						OK
			Rachid Thiam	Départ équipe Gigan	OK	
			Dalila Ajjaji		OK	
			Kalthoum Ben Mbarek		OK	
			Simon Kulifaj		OK	

Salle L378-L380 (Option B équipe Thiam)

		Départ			Arrivée	Disponibilité salle
			Rachid Thiam		15-17/04/2015 et jusqu'au 06-07/05/2015 (arrivée Boucquet)	
			Dalila Ajjaji			
			Kalthoum Ben Mbarek			
			Simon Kulifaj			

Ditrib Sadhu ????

Laboratoire	Prénom Nom	Départ	Arrivée	Déménagement	
Bureau d'étude	Jean-Michel Isac	L070	Bungalow RDC	27-29/04/2015	
	Nabil Garroum	L070			
	Anastasia Fialkov	L059			
	Michael Koepf,	L059	Bungalow		
			4è étage Ulm		
LKB	Leander Hohmann	LS166	4 ^e étage Ulm	04-06/05/2015	
	Bouchiat	L184	Bungalow R+1	20-22/04/2015	
LPS	Van Houke	L059a	Bungalow RDC	04-06/05/2015	
	Nadal	E234	Bungalow R+1	20-22/04/2015	
	Nigues				
	Combescot	L286		13-15/04/2015	
		Brotto	E225	4è étage Ulm	
		Tavoni	E225		
		Sun	E225		
		Retaux	E225		
		Kulkarni	E225		
		Gardella	E225		
		Ranft	E242		20-22/04/2015
		Rodriguez Imazio	E236		20-22/04/2015
		Prat Carabin	E236		20-22/04/2015
		Pernice	E236		20-22/04/2015
		Mastrogiuseppe	E236		20-22/04/2015
		Comparin	L057		27-29/04/2015
		Rossi	L057		27-29/04/2015
		Michel Manon	L057		27-29/04/2015
		Feltgen	E234		20-22/04/2015
		Jacquín	L186		20-22/04/2015
		Alaa Saade	L284	13-15/04/2015	
		Marylou Gabriele	L284	13-15/04/2015	
		Secchi		RDC Ulm	
		Keyser			
		Quintas	LS155		04-06/05/2015
		Nicolau	LS155		04-06/05/2015
	Goncalves	LS155	04-06/05/2015		

Démarches en cours concernant la préparation de la prochaine opération de déménagement :

A) Rectorat-MOE

- 1- L'accès à la salle LS164 à partir du 27 avril 2015 pour stocker les vitrines et le matériel scientifique ancien qui se trouvent au RDC.
- 2- Libération de l'espace de la zone jardin, à coté des fenêtres de LS167-169 et l'accès au cheminement vers la benne pour l'évacuation du mobilier à la benne.
- 3- Demande d'accès à l'atelier LS190 pour M. Jean Marc Jusseau, M. Franck Bouchereau, et M. Philippe Rousseau durant la phase 3B.

B) ENS

- 1- Service Hygiène et Sécurité qui gère la collecte du matériel informatique-électronique.
- 2- Service Patrimoine qui gère le remplacement de la benne du 18 Lhomond.
- 3- Dpt. de Physique:
 - 3.1 Les couloirs doivent être complètement libérés d'objets/mobilier** tels que :
Les armoires métalliques du RDC (atelier ???), le mobilier du R+1 (LKB ???) ainsi que ceux de la cage d'ascenseur du R+1 (???) et R+2 (LPS ???) et du SS2 (LKB ???).
 - 3.2 Les appareils de climatisation (LPS, LKB ???), matériel informatique (LPA ???) et appareil scientifique et caissons (LKB ???) qui sont stockés temporairement dans la salle **LS192 doivent être évacués.****
 - 3.3 Les produits chimiques de l'armoire de la salle ES206 (local à pompes du SS2)**

Documents déménagement envoyés le 26 mars 2015:

L082 **Bureau**


côté mur de la porte

Par l'entreprise : Déplacer le fauteuil et la table afin de libérer un espace d'1m devant le mur



mur d'en face, côté fenêtre

En interne : Débarrasser et vider les 2 bureaux de leur contenu
Par l'entreprise : Superposer les 2 bureaux contre le mur de gauche




centre de la pièce

En interne : Débarrasser et vider le bureau
Par l'entreprise : Déplacer le bureau contre le mur de gauche




Déménagement équipes Pincet, Fauve , Adda-Bedia et Bocquet:

L'entreprise de déménagement aura besoin d'informations concernant l'implantation des appareils/mobilier pour les salles L357/359, L372 et L378/L380.

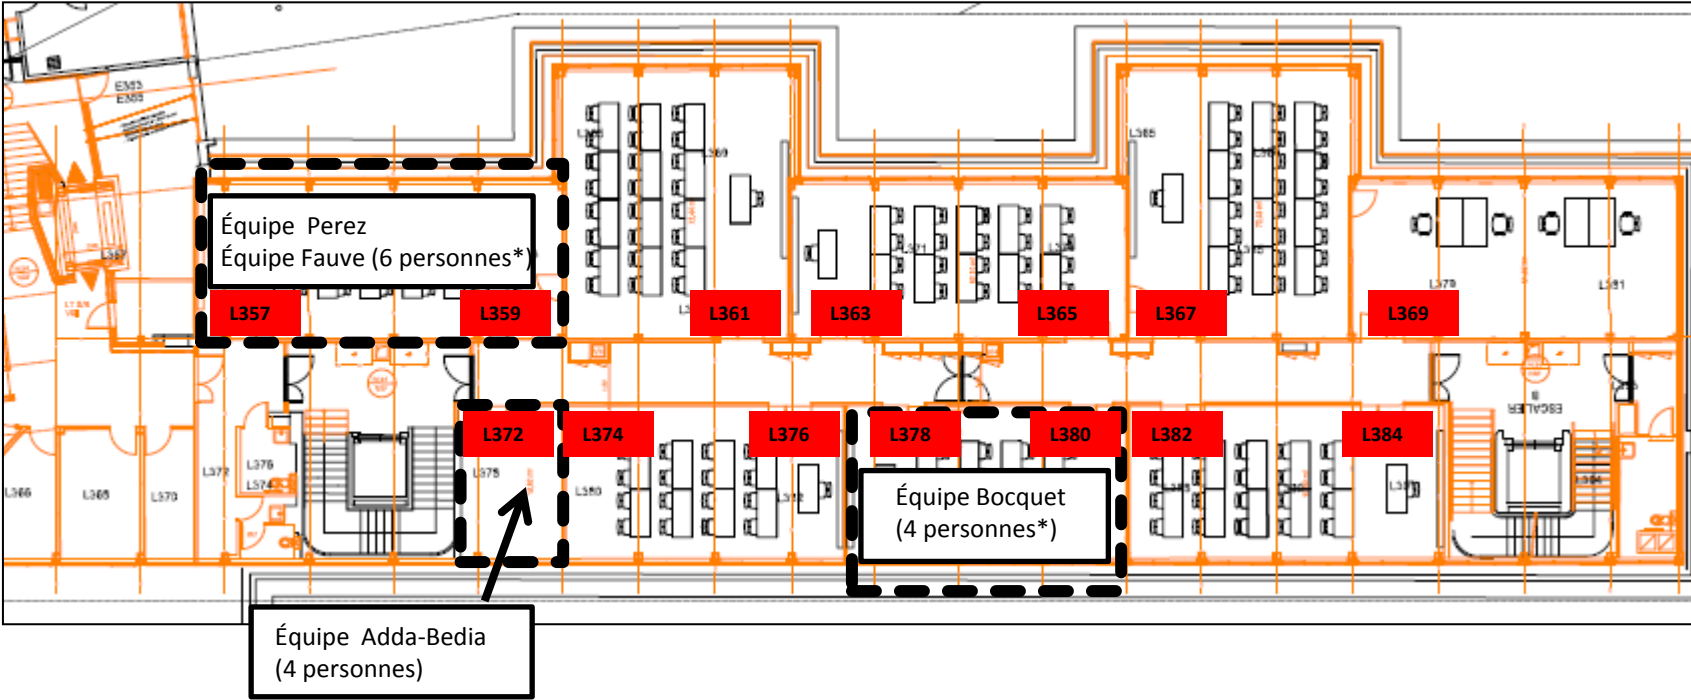

Salle stockage équipes Pincet, Fauve, Davitt, Croquette et Heslot:

Le 24 mars 2015, la proposition suivante d'implantation pour la salle L261 a été envoyée aux équipes

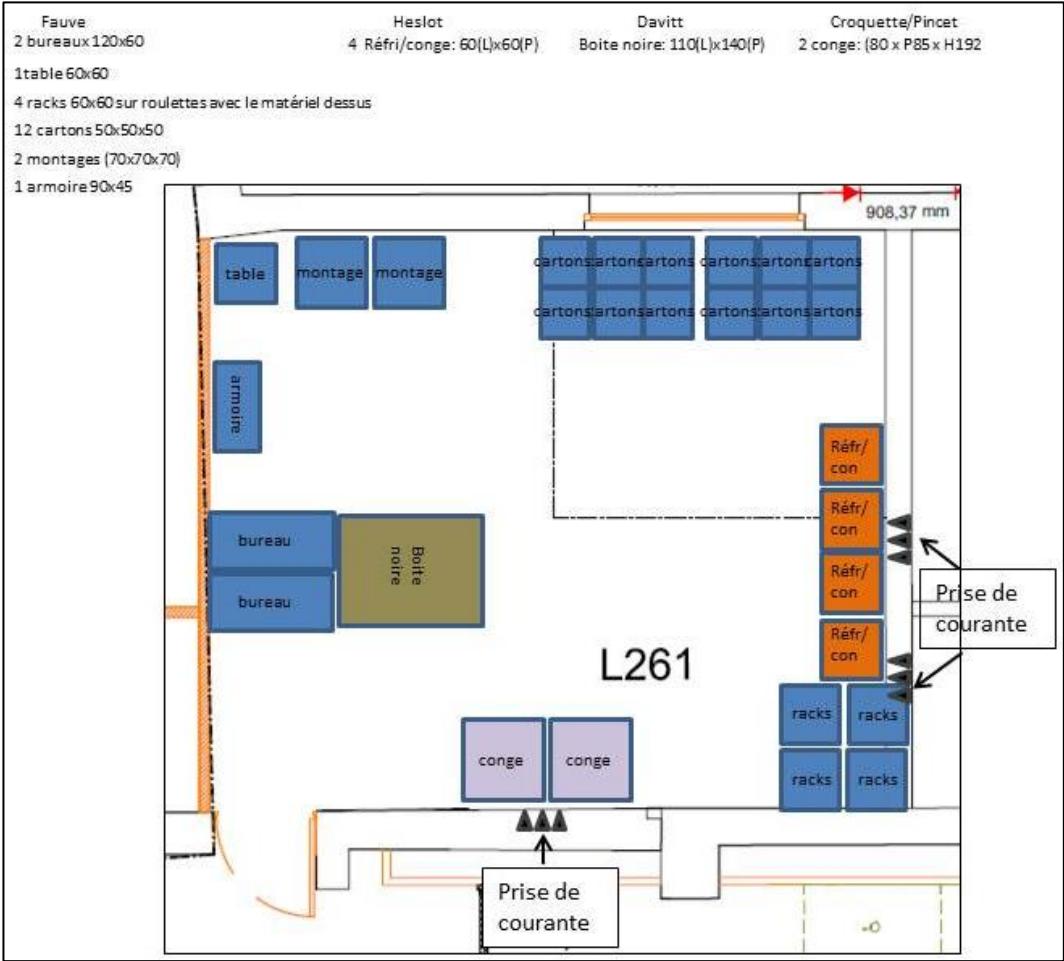

L'entreprise de déménagement aura besoin d'informations concernant l'implantation des appareils/mobilier pour la salle L261.
